(鲁能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/DZ2026-214

煤矿用阻燃线缆

安全检测报告

委托单位:山东省三河口矿业有限责任公司

受检单位:山东省三河口矿业有限责任公司

样品名称:煤矿用通信电缆

规格型号:MHSYV-5 4×2×0.5

检测类别:委托检测

检测日期:2026年8月27日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用阻燃线缆安全检测报告

委托单位	名称	山东省三河口矿业有限责任公司		
	地址	济宁市微山县付村镇		
样品名称	煤矿用通信电缆			
生产厂家	天津市万博线缆有限公司		产品生产日期	2025年7月24日
安全标志编号	MIA210506		检测类别	委托检测
接收日期	2026年8月24日		检测日期	2026年8月27日
样品状态	新品、干燥		样品数量	2.1m
检测地点	皮带检测检验室		规格型号	MHSYV-5 4×2×0.5
受检单位	山东省三河口矿业有限责任公司		抽送样人员	李永现
检测项目	单根电线电缆垂直燃烧试验			
检测依据	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》			
存在问题及建议	无			
检测结论	依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。 (检测检验专用章) 2026年8月28日			
备注	/			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
机械秒表	YQ-3-510	PC393	U=0.1s k=2	LNDC-260605282075
单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置	YQ-3-503	XT-DZ1	/	/
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=2%RH U=0.2℃ k=2	LNDC-260205282237
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm k=2	LNDC-260105282224
此页以下空白				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用阻燃线缆安全检测数据

1.单根电线电缆垂直燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	供火时间(s)
1	24.2	65.1	60
试验项目	标准要求	实测结果	单项判定
上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm)	＞50	395	合格
燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm)	≤540	499	合格

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

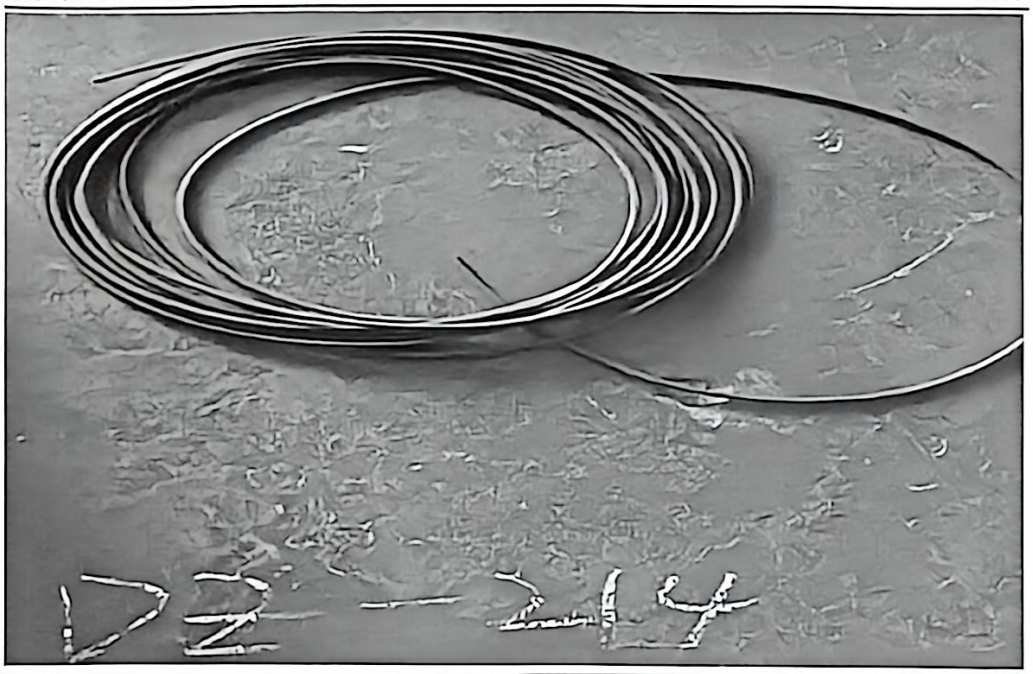
DZ-214


MA
安全标志编号：MIA210506
矿用产品安全标志证书
合格证
MHSYV-5 1×2×0.5
2025 07 24
