(鲁能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/PD2026-129

煤矿用织物阻燃输送带

安全检测报告

委托单位:云南后所煤矿有限公司

受检单位:云南后所煤矿有限公司兴云煤矿

样品名称:橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号:PVG 1400S×800mm

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月11日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖枣矿中兴电气有限公司 “检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称： 山东枣矿中兴电气有限公司

检 测 地 址： 山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码： 277011

电 话： 0632-4093458

网 址： www.zkaqjczx.com

报告编号： ZKAJ/PD2026-129

煤矿用织物阻燃输送带

委托单位	名称	云南后所煤矿有限公司	
	地址	云南省曲靖市富源县胜境街	
样品名称	橡胶面整芯阻燃输送带		
生产厂家	保定三叶橡胶机带制造有限公司	样品生产日期	
安全标志编号	MIB200120	检测类别	
样品接收日期	2026 年 9 月 8 日	检测日期	
样品状态	完好 适合检测	样品数量	
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	
受检单位	云南后所煤矿有限公司兴云煤矿	抽送样人员	
检测项目	表面电阻、酒精喷灯燃烧试验		
检测依据	MT/T 914-2019 《煤矿用		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据 MT/T 914-2019 《煤矿用织合格。		
备注	委托单位仅要求表面电阻、酒精喷灯筒摩擦试验四项检测。		

批准： 审核：

日期：2026.9.15 日期：2026.9.15

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用织物阻燃输送带安全检测报告

委托单位	名称	云南后所煤矿有限公司	
	地址	云南省曲靖市富源县胜境街道后所煤矿社区刘家湾	
样品名称	橡胶面整芯阻燃输送带		
生产厂家	保定三叶橡胶机带制造有限公司	样品生产日期	2026 年 09 月 01 日
安全标志编号	MIB200120	检测类别	委托检测
样品接收日期	2026 年 9 月 8 日	检测日期	2026 年 9 月 11 日
样品状态	完好 适合检测	样品数量	3m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	PVG 1400S×800mm
受检单位	云南后所煤矿有限公司兴云煤矿	抽送样人员	和海涛
检测项目	表面电阻、酒精喷灯燃烧试验、拉伸强度、滚筒摩擦		
检测依据	MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据 MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026 年 9 月 15 日		
备注	委托单位仅要求表面电阻、酒精喷灯燃烧试验、拉伸强度测定、滚筒摩擦试验四项检测。		

批准： 日期：2026.9.15　　审核： 日期：2026.9.15　　主检： 日期：2026.9.15

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备、仪器和仪表

检验环境： 温度：23.5℃ 相对湿度：64.3％RH

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
滚筒摩擦试验台	YQ-3-504	GF-90	U_{rel}=0.3%	LNDC-260305282185
高绝缘电阻测量计	YQ-3-505	ZC46A	U_{rel}=1.3%	LDDC-260605282074
微机屏显式液压万能试验台	YQ-3-506	WEW-300B	U_{rel}=0.2%	LNDC-260305280039
电子秒表	YQ-3-511	SJ9-2II	U=0.01s	LNDC-260605282076
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=0.2℃ U=2％RH	LNDC-260205282237
游标卡尺	YQ-3-515	0-150mm	U=0.01mm	LNDC-260105282223
钢直尺	YQ-3-517	1m	U=0.1mm	LNDC-260105282225
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm	LNDC-260105282224
可程式恒温恒湿试验箱	YQ-1-524	GDJS-100	U=0.40℃ U=2.2％RH	LNDC-260205280050
酒精喷灯燃烧箱	YQ-3-507	/	/	/
此页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测数据及结果

一、表面电阻

检测项目	标准要求	检测结果	结果
上表面电阻算数平均值	≤$3\times10^{8}\Omega$	$1.97\times10^{8}\Omega$	合格
下表面电阻算数平均值	≤$3\times10^{8}\Omega$	$2.05\times10^{8}\Omega$	合格

二、酒精喷灯燃烧试验

试样		燃烧时间（s）							
		平均值				最大值			
		有焰	无焰	标准要求	结果	有焰	无焰	标准要求	结果
具有覆盖胶		1.82	1.89	≤3	合格	1.94	2.02	≤10	合格
剥去覆盖胶	横向	1.95	1.98	≤5	合格	2.14	2.24	≤15	合格
	纵向	2.01	2.02	≤5	合格	2.34	2.39	≤15	合格

三、拉伸强度测定 单位：（N/mm）

纵向标准要求	纵向平均值	结果
≥1400	1484	合格
横向标准要求	横向平均值	结果
≥350	445	合格

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、滚筒摩擦试验

试样	序号	试验条件	配重（N）	试验时间（min）	滚筒表面最高温度℃			有无火星	结果
					标准要求	实测温度℃	单项结果		
上表面	1	吹风	343	16′ 23″	滚筒表面温度不大于325℃	243	合格	无	合格
	2	不吹风	343	15′ 57″		252	合格	无	合格
	3	吹风	343	16′ 11″		239	合格	无	合格
	4	不吹风	343	16′ 33″		247	合格	无	合格
下表面	1	吹风	343	14′ 26″	无火星	240	合格	无	合格
	2	不吹风	343	14′ 58″		254	合格	无	合格
	3	吹风	/	/		/	/	/	/
	4	不吹风	/	/		/	/	/	/

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

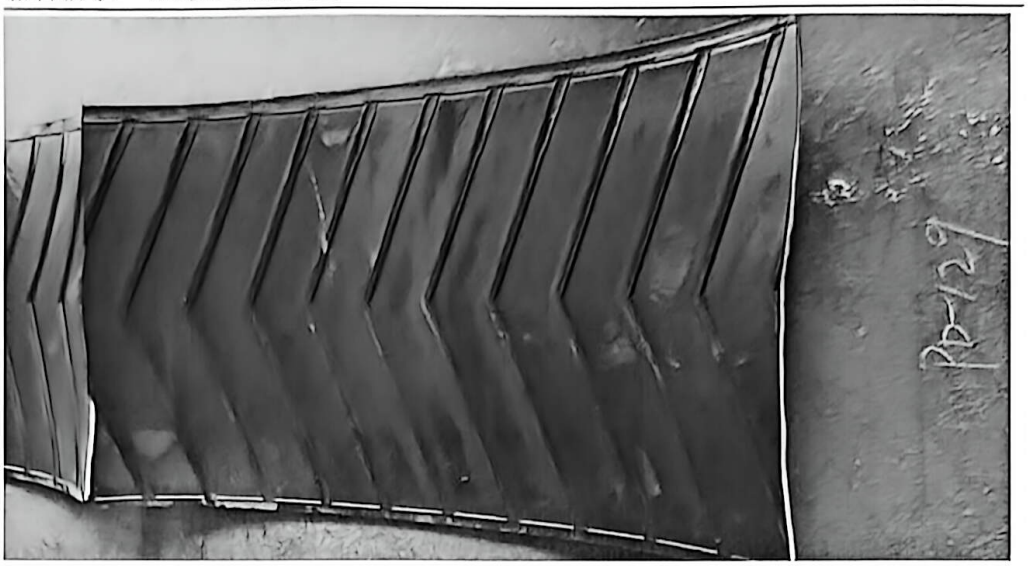

煤安标志认证 ISO14001 OHSAS18001 ISO9001

产品合格证

产品名称：橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号：PVG1400S×800mm

数　　量：100米

质 检 员：检-2

出厂日期：2026年09月01日

执行标准：MT/T 914-2019

三叶 ®保定三叶橡胶机带制造有限公司

地址：河北省博野县城东南

合格

安全标志编号：MIB200120

矿用产品安全标志证书

持 证 人： 保定三叶橡胶机带制造有限公司

注册地址： 博野县县城东南

生产单位： 保定三叶橡胶机带制造有限公司

生产地址： 河北省保定市博野县县城东南

产品名称： 橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号： 1400S

产品标准及技术条件： MT/T 914-2019

适用范围： 产品在煤矿安全有关地点使用。

发证日期： 2025年03月25日 有效期至： 2030年03月24日

备　　注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABQZ-HA-IBA-2024-02规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监管获得保持，相关信息及主要零元部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。

签发人： 发证机构：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App
