(鲁能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/PD2026-130

煤矿用织物阻燃输送带

安全检测报告

委托单位:枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿

受检单位:枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿

样品名称:橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号:PVG 1000S×1000mm

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月14日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖枣矿中兴电气有限公司 “检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称： 山东枣矿中兴电气有限公司

检 测 地 址： 山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码： 277011

电 话： 0632-4093458

网 址： www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用织物阻燃输送带安全检测报告

委托单位	名称	枣庄矿业（集团）有限责任公司滨湖煤矿	
	地址	滕州市望庄镇	
样品名称	橡胶面整芯阻燃输送带		
生产厂家	山东亿和橡胶输送带有限公司	样品生产日期	2026 年 6 月 15 日
安全标志编号	MIB 110059	检测类别	委托检测
样品接收日期	2026 年 9 月 9 日	检测日期	2026 年 9 月 14 日
样品状态	新品	样品数量	3m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	PVG 1000S×1000mm
受检单位	枣庄矿业（集团）有限责任公司滨湖煤矿	抽送样人员	王斌
检测项目	外观质量、宽度极限偏差、覆盖层厚度、拉伸强度、拉断伸长率、表面电阻、滚筒摩擦、酒精喷灯燃烧试验、撕裂力、黏合强度		
检测依据	MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据 MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026 年 9 月 18 日		
备注	/		

批准：[illegible] 审核：[illegible] 主检：[illegible]

日期：2026.9.18 日期：2026.9.15 日期：2026.9.15

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备、仪器和仪表

检验环境： 温度：23.7℃ 相对湿度：63.9％RH

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
滚筒摩擦试验台	YQ-3-504	GF-90	U_{rel}=0.3%	LNDC-260305282185
高绝缘电阻测量计	YQ-3-505	ZC46A	U_{rel}=1.3%	LDDC-260605282074
微机屏显式液压万能试验台	YQ-3-506	WEW-300B	U_{rel}=0.2%	LNDC-260305280039
电子式拉力试验机	YQ-3-523	DLL-50000	U_{rel}=0.2%	LNDC-260305280040
电子秒表	YQ-3-511	SJ9-2II	U=0.01s	LNDC-260605282076
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=0.2℃ U=2％RH	LNDC-260205282237
游标卡尺	YQ-3-515	0-150mm	U=0.01mm	LNDC-260105282223
钢直尺	YQ-3-517	1m	U=0.1mm	LNDC-260105282225
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm	LNDC-260105282224
可程式恒温恒湿试验箱	YQ-1-524	GDJS-100	U=0.40℃ U=2.2％RH	LNDC-260205280050
酒精喷灯燃烧箱	YQ-3-507	/	/	/
此页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测数据及结果

外观质量检查			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
外观质量检查	1、 阻燃带表面应平整，无影响使用的明疤、缺胶和裂痕。 2、 带芯应由覆盖层完全封闭，以防受潮变质。	符合标准要求	合格

宽度极限偏差			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
皮带宽度尺寸	(1000±1%)mm	1002mm	合格

表面电阻			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
上表面电阻算数平均值	$\leqslant 3\times10^{8}\Omega$	1.77×10^{8}	合格
下表面电阻算数平均值	$\leqslant 3\times10^{8}\Omega$	1.87×10^{8}	合格

覆盖层厚度测量			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
上覆盖层厚度	橡胶面覆盖层均不小于 1.5mm	1.53mm	合格
下覆盖层厚度		1.52mm	合格

酒精喷灯燃烧试验

试样		燃烧时间（s）							
		平均值				最大值			
		有焰	无焰	标准要求	结果	有焰	无焰	标准要求	结果
具有覆盖胶		1.81	1.85	≤3	合格	1.94	1.98	≤10	合格
剥去覆盖胶	横向	1.89	1.91	≤5	合格	2.14	2.17	≤15	合格
	纵向	2.00	2.01	≤5	合格	2.29	2.36	≤15	合格

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

拉伸强度、拉断伸长率

检测项目		标准要求	检测结果	结果
纵向	拉伸强度（N/mm）	≥1000	1105	合格
	拉断伸长率（%）	≥15	17.3	合格
横向	拉伸强度（N/mm）	≥300	412	合格
	拉断伸长率（%）	≥18	23.9	合格

滚筒摩擦试验

试样	序号	试验条件	配重（N）	试验时间（min）	滚筒表面最高温度℃			有无火星	结果
					标准要求	实测温度℃	单项结果		
上表面	1	吹风	343	14′ 32″	滚筒表面温度不大于325℃ 无火星	248	合格	无	合格
	2	不吹风	343	14′ 27″		253	合格	无	合格
	3	吹风	343	14′ 45″		237	合格	无	合格
	4	不吹风	343	13′ 56″		258	合格	无	合格
下表面	1	吹风	343	14′ 19″		252	合格	无	合格
	2	不吹风	343	13′ 59″		241	合格	无	合格
	3	吹风	343	/		/	/	/	/
	4	不吹风	343	/		/	/	/	/

撕裂力测定

检测项目	撕裂力 (N)	平均撕裂力(N)	标准值(N)	结果
A 向	1425	1437	≥1200	合格
	1439			
	1446			
B 向	1438	1438	≥1 200	合格
	1434			
	1442			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

黏合强度测定						
检测项目		黏合强度平均值（N/mm）		黏合强度最小值（N/mm）		结果
		实测值	标准值	实测值	标准值	
横向	覆盖层与带芯间	6.24	≥4.00	4.38	≥3.25	合格
	带芯内部	/		7.82	≥6.5	合格
纵向	覆盖层与带芯间	6.21	≥4.00	4.40	≥3.25	合格
	带芯内部	/		7.89	≥6.5	合格

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

报告编号： ZKAJ/PD2026-130　　附件 1

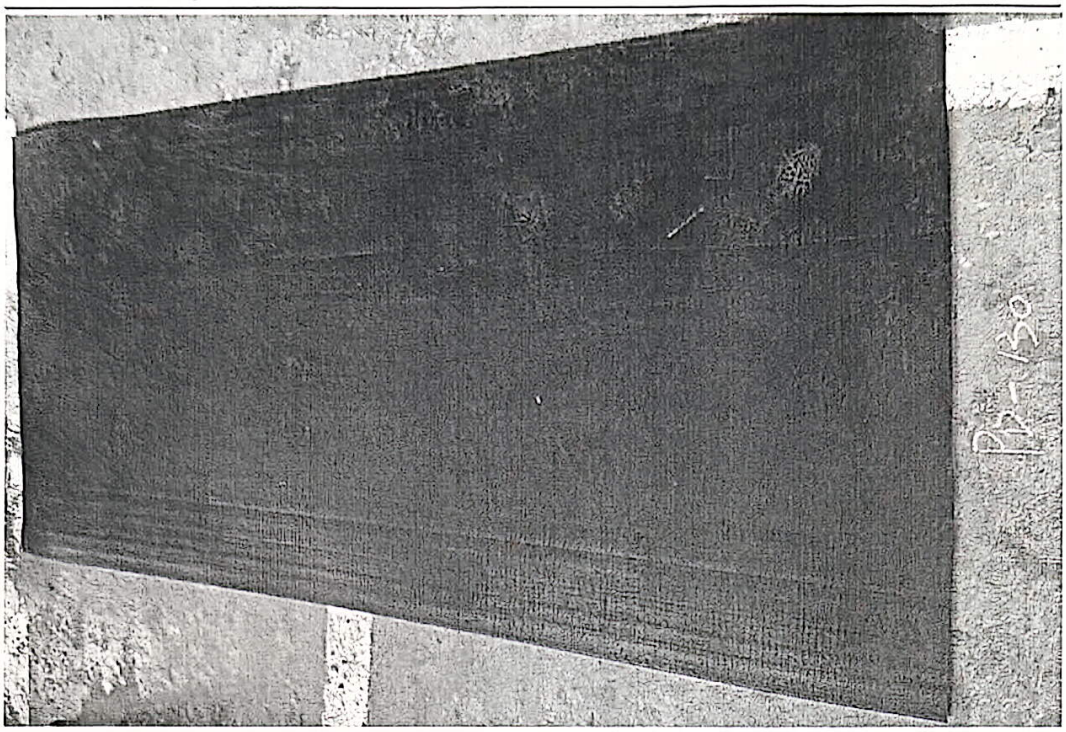

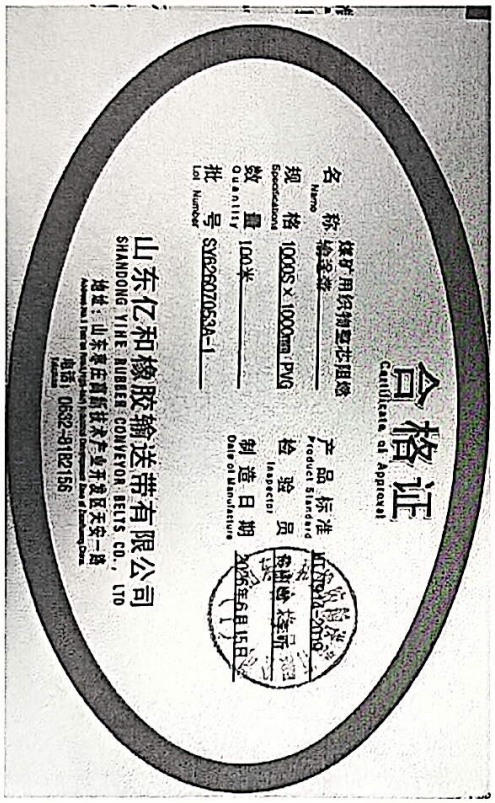

合格证
Certificate of Approval

名称 Name：煤矿用织物整芯阻燃输送带
规格 Specifications：1000S×1000mm PVG
数量 Quantity：100米
批号 Lot Number：SY62607053A-1
产品标准 Product Standard：MT 914-2019
检验员 Inspector：
制造日期 Date of Manufacture：2026年6月15日

山东亿和橡胶输送带有限公司
SHANDONG YIHE RUBBER CONVEYOR BELTS CO., LTD
地址：山东枣庄高新技术产业开发区天安一路
Address: No.1 Tian'an Road, Hi-Tech Industrial Development Zone of Zhaozhuang, China
电话：0632-8182156
Telephone

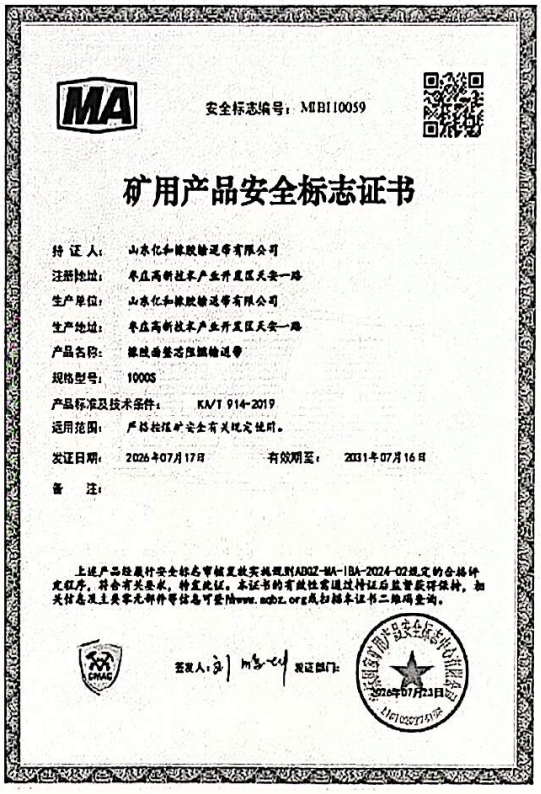

MA　安全标志编号：MIBI10059

矿用产品安全标志证书

持证人：山东亿和橡胶输送带有限公司
注册地址：枣庄高新技术产业开发区天安一路
生产单位：山东亿和橡胶输送带有限公司
生产地址：枣庄高新技术产业开发区天安一路
产品名称：橡胶曲整芯阻燃输送带
规格型号：1000S
产品标准及技术条件：KA/T 914-2019
适用范围：严格按照矿安全有关规定使用。
发证日期：2026年07月17日　有效期至：2031年07月16日
备注：

上述产品经最行安全标志审核复核实施规则ABQZ-MA-IBA-2024-02规定的合格评定程序，符合有关要求，特宜此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零元部件等信息可登陆www.mqbz.org或扫描本证书二维码查询。

签发人：　发证部门：

2026年07月23日
