（鲁）能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/PD2026-118

煤矿用织物阻燃输送带

安全检测报告

委托单位:山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司

受检单位:山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司

样品名称:橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号:PVG 1000S×650mm

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月1日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖枣矿中兴电气有限公司 “检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称： 山东枣矿中兴电气有限公司

检 测 地 址： 山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码： 277011

电 话： 0632-4093458

网 址： www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用织物阻燃输送带安全检测报告

委托单位	名称	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司	
	地址	山西省晋城市高平市寺庄镇伯方村	
样品名称	橡胶面整芯阻燃输送带		
生产厂家	枣庄众泰橡胶有限公司	样品生产日期	2026 年 8 月 20 日
安全标志编号	MIB 060167	检测类别	委托检测
样品接收日期	2026 年 8 月 27 日	检测日期	2026 年 9 月 1 日
样品状态	完好 适合检验	样品数量	3m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	PVG 1000S×650mm
受检单位	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司	抽送样人员	王育峰
检测项目	外观质量、宽度极限偏差、表面电阻、酒精喷灯燃烧试验、拉伸强度测定、滚筒摩擦		
检测依据	MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据 MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026 年 9 月 1 日		
备注	生产/出厂编号:G6650-2608-2。 委托单位仅要求外观质量、宽度极限偏差、表面电阻、酒精喷灯燃烧试验、拉伸强度测定、滚筒摩擦试验六项检测。		

批准： 审核： 主检：

日期：2026.9.1 日期：2026.9.1 日期：2026.9.1

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备、仪器和仪表

检验环境： 温度：23.2℃ 相对湿度：64.3％RH

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
滚筒摩擦试验台	YQ-3-504	GF-90	U_{rel}=0.3%	LNDC-260305282185
高绝缘电阻测量计	YQ-3-505	ZC46A	U_{rel}=1.3%	LDDC-260605282074
微机屏显式液压万能试验台	YQ-3-506	WEW-300B	U_{rel}=0.2%	LNDC-260305280039
电子秒表	YQ-3-511	SJ9-2II	U=0.01s	LNDC-260605282076
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=0.2℃ U=2％RH	LNDC-260205282237
游标卡尺	YQ-3-515	0-150mm	U=0.01mm	LNDC-260105282223
钢直尺	YQ-3-517	1m	U=0.1mm	LNDC-260105282225
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm	LNDC-260105282224
可程式恒温恒湿试验箱	YQ-1-524	GDJS-100	U=0.40℃ U=2.2％RH	LNDC-260205280050
酒精喷灯燃烧箱	YQ-3-507	/	/	/
此页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测数据及结果

外观质量检查			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
外观质量检查	1、 阻燃带表面应平整，无影响使用的明疤、缺胶和裂痕。 2、 带芯应由覆盖层完全封闭，以防受潮变质。	符合标准要求	合格

宽度极限偏差			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
皮带宽度尺寸	(650±7)mm	654mm	合格

表面电阻			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
上表面电阻算数平均值	$\leqslant 3\times10^{8}\Omega$	1.79×10^{8}	合格
下表面电阻算数平均值	$\leqslant 3\times10^{8}\Omega$	1.85×10^{8}	合格

覆盖层厚度测量			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
上覆盖层厚度	/	/	/
下覆盖层厚度		/	/

酒精喷灯燃烧试验

试样		燃烧时间（s）							
		平均值				最大值			
		有焰	无焰	标准要求	结果	有焰	无焰	标准要求	结果
具有覆盖胶		1.79	1.86	≤3	合格	1.95	2.02	≤10	合格
剥去覆盖胶	横向	1.96	1.98	≤5	合格	2.21	2.26	≤15	合格
	纵向	1.99	2.04	≤5	合格	2.30	2.35	≤15	合格

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

拉伸强度、拉断伸长率

检测项目		标准要求	检测结果	结果
纵向	拉伸强度（N/mm）	≥1000	1077	合格
	拉断伸长率（%）	≥15	/	/
横向	拉伸强度（N/mm）	≥300	395	合格
	拉断伸长率（%）	≥18	/	/

滚筒摩擦试验

试样	序号	试验条件	配重（N）	试验时间（min）	滚筒表面最高温度℃			有无火星	结果
					标准要求	实测温度℃	单项结果		
上表面	1	吹风	343	13′ 16″	滚筒表面温度不大于325℃ 无火星	241	合格	无	合格
	2	不吹风	343	13′ 58″		236	合格	无	合格
	3	吹风	343	12′ 47″		245	合格	无	合格
	4	不吹风	343	13′ 09″		229	合格	无	合格
下表面	1	吹风	343	13′ 21″		238	合格	无	合格
	2	不吹风	343	13′ 33″		243	合格	无	合格
	3	吹风	343	/		/	/	/	/
	4	不吹风	343	/		/	/	/	/

撕裂力测定

检测项目	撕裂力 (N)	平均撕裂力(N)	标准值(N)	结果
A 向	/	/	/	/
	/			
	/			
B 向	/	/	/	/
	/			
	/			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

黏合强度测定						
检测项目		黏合强度平均值（N/mm）		黏合强度最小值（N/mm）		结果
		实测值	标准值	实测值	标准值	
横向	覆盖层与带芯间	/	≥4.00	/	≥3.25	/
	带芯内部	/		/	≥6.5	/
纵向	覆盖层与带芯间	/	≥4.00	/	≥3.25	/
	带芯内部	/		/	≥6.5	/

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

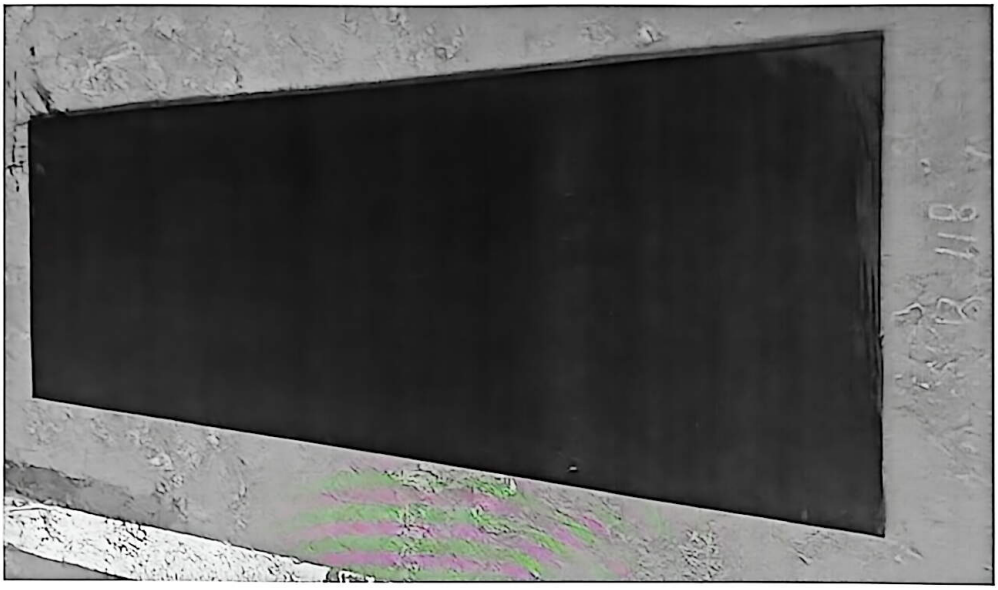



枣庄众泰橡胶有限公司

产品合格证

注册 众泰 商标

产品名称：橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号：PVG1000S-630mm

长　　度：3m

批　　号：G6650-2608-2

生产日期：2026.8.20

检 验 员：02

执行标准：MT/T914-2019

厂址：枣庄经济开发区黄山路3号

电话：0632-3759010

传真：0632-3759009

邮箱：zhongtaixiangjiao@163.com



安全标志编号：MIB060167

矿用产品安全标志证书

持 证 人： 枣庄众泰橡胶有限公司

注册地址： 山东省枣庄市市中区工业园

生产单位： 枣庄众泰橡胶有限公司

生产地址： 山东省枣庄市市中区工业园黄山路3号

产品名称： 橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号： 1000S

产品标准及技术条件： MT/T 914-2019

适用范围： 产品性能矿安全有关规定使用。

发证日期： 2025年09月09日　　有效期至： 2030年09月08日

备　　注：

上述产品经通行安全标志审核发放实施规则ABGZ-BA-IBA-2224-02规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要常见部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。

签发人： 王钟烨　　发证部门：

2025年09月09日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
